



Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore – Area Servizi Tecnici

Lavori di Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali. – Liceo Classico di Mussomeli.

Progetto Esecutivo

Importo lavori a base d'asta	€.	33.873,23
Importi della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.735,42</u>
IMPORTO LAVORI	€.	35.608,65
Somme a disposizione	€.	<u>14.391,35</u>
TOTALE	€.	50.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Ufficio Tecnico – Settore 8°

Parere di Validazione

N. ____ / U.T. del ____.


Visto il parere tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 del ____.

Visto il rapporto di verifica di cui all'art. 45 del D.P.R. 207/2010 del ____.

Si Esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010

Caltanissetta ____.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)

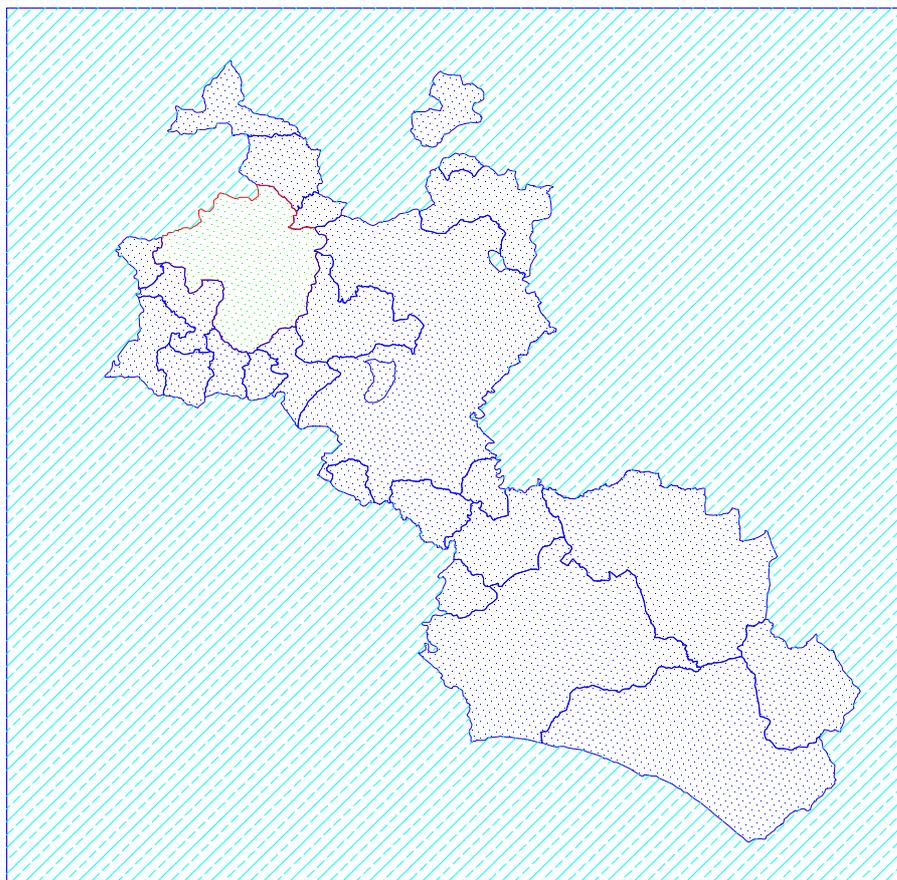

ALLEGATI

- Relazione Tecnica**
- Corografia**
- Elaborati grafici**
- Analisi dei prezzi**
- Elenco Prezzi**
- Computo Metrico**
- Stima incidenza manodopera**
- Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto**
- Norme tecniche di accettazione materiali e di misurazione.**
- Relazione DUVRI**
- Cronoprogramma**

Caltanissetta **29.11.2011**

Ufficio Progettazione
Geom. Salvatore Lipani

Il Progettista
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Luigi Parrinello

Il Dirigente VIII Settore
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella



Oggetto: Lavori di Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali. –
Liceo Classico di Mussomeli.

Relazione D.U.V.R.I.

I lavori in oggetto indicati saranno eseguiti all'interno dell'edificio sede dell'Istituzione scolastica.

Con riferimento al D. Lgs. n° 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro", considerate la tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire ed il tipo di attività che si svolge all'interno dell'edificio (attività scolastica) si ritiene di:

- prescindere dalla redazione, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 art. 100, del Piano di Sicurezza e Coordinamento considerato che, stante la natura dei lavori e la loro specifica settorialità, si prevede non vi sarà compresenza di due o più imprese e, quindi, rischi da interferenze nell'attività lavorative relative all'esecuzione degli stessi;
- dover redigere, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 art. 26 comma 3 ter, il D.U.V.R.I., in considerazione del fatto che andranno eliminati o, ove ciò non è possibile, ridotti al minimo i rischi da interferenza tra l'attività lavorativa dell'impresa che realizzerà i lavori e l'attività lavorativa (scolastica) che si svolge quotidianamente all'interno ed all'esterno dell'edificio sede dei lavori stessi (ritenendo presumibile che quando i lavori avranno inizio sarà in pieno svolgimento l'attività didattica relativa all'anno scolastico 2010/2011).


Quanto sopra dovrà riguardare, nello specifico, la protezione e la salvaguardia degli utenti della scuola dai rischi relativi alla esecuzione dei lavori e, quindi, si dovrà:

1. inibire adeguatamente agli utenti l'accesso alle zone in cui si svolgono i lavori, per evitare ogni possibile contatto e conseguenti infortuni;
2. proteggere gli utenti della scuola dalle interferenze acustiche causate dalla esecuzione dei lavori stessi;
3. evitare l'esposizione ed il contatto degli utenti alle polveri e/o quant'altro potrà derivare da determinate lavorazioni (scavi a sezione obbligata, dismissione di pavimenti e/o rivestimenti murali, realizzazione di tracce murarie per l'alloggiamento di condotti, saldature, etc...etc...).

Si ritiene, altresì, dover specificare che gli interventi che si prevede realizzare sono concentrati nella palestra dell'istituto e nel piano secondo delle aule, e pertanto tali aree, saranno opportunamente inibite all'accesso e protette dalle polveri e dai rumori, per l'intera durata dei lavori.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai lavori che si andranno ad eseguire, si valutano e quantificano i relativi costi per la sicurezza come di seguito, dettagliatamente, descritto.

Il Progettista
Dott. Arch. Luigi Parrinello

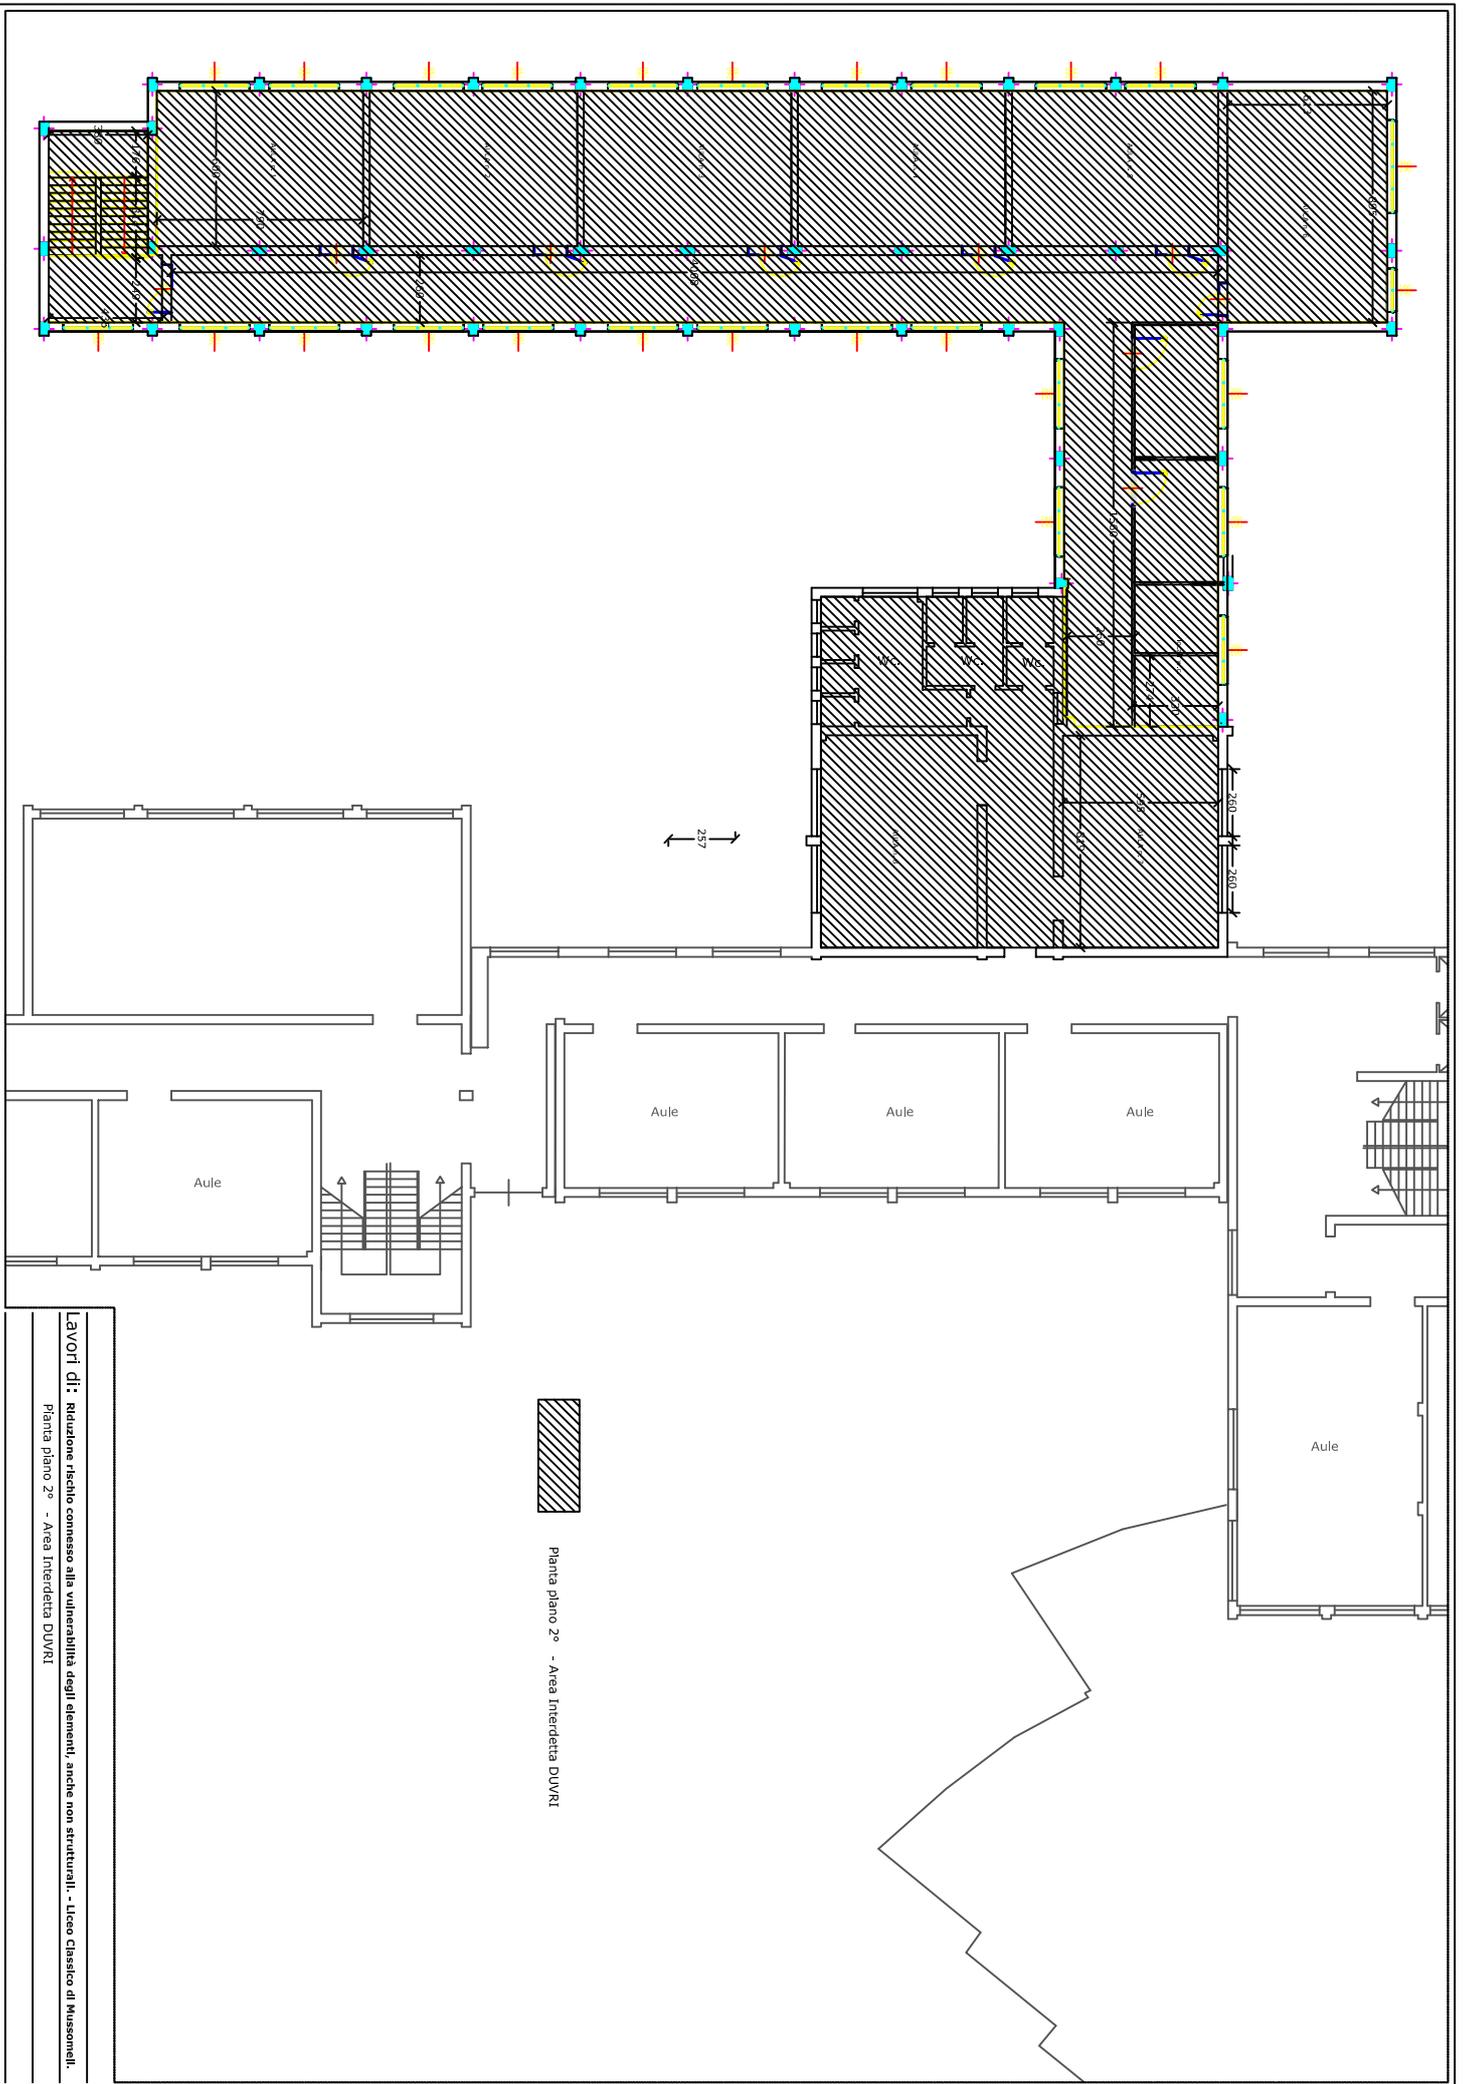

LAVORI DI: Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali. - Liceo Classico di Mussomeli.
 Pianta piano 2° - Area Interdetta DUVRI



Pianta piano 2° - Area Interdetta DUVRI



COMPUTO METRICO

Costi della sicurezza

OGGETTO: Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Liceo Classico di Mussomeli. COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

Caltanissetta, 29/11/2011

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.03.010.050 .a 08/07/2010	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m ² , valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia		24,00			24,00		
	SOMMANO m ²					24,00	1,60	38,40
2 P.01.010.090 .b 08/07/2010	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi rivestiti in lamiera per abbattimento acustico con valori di abbattimento oltre i 32 Db forniti in opera con relativi supporti in acciaio Fornitura con moduli di altezza pari a m 3,00		24,00			24,00		
	SOMMANO m ²					24,00	41,44	994,56
3 23.01.07 09/07/2010	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm a maglia rettangolare fissata perimetralment ... inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio		12,00			12,00		
	SOMMANO al m ²					12,00	15,80	189,60
4 23.01.11 09/07/2010	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	52,30	52,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'274,86
	T O T A L E euro							1'274,86
	Caltanissetta, 29/11/2011							
	Il progettista Dott. Arch. Luigi Parrinello							
	A R I P O R T A R E							

